



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Relatório de Gestão de Risco do Plano de Contratações Anual - Julho/2025

Realizado com base nos dados informados no PGC/PCA até 30 de junho de 2025

Relatório de gestão de riscos PCA para atendimento ao artigo 17, do Decreto N.º 10.947/2023, referente a versão julho/2025

1. Introdução

O Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, estabelece em seu artigo 19 que a partir de julho do ano de execução do Plano de Contratações Anual (PCA), os setores de contratações elaborarão relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do PCA até o término daquele exercício. Além disso:

§ 1º O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima bimestral e sua apresentação deverá ocorrer, no mínimo, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano. § 2º O relatório de que trata o § 1º será encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes.

Esses relatórios deverão ser elaborados uma frequência mínima de dois meses, a fim de que a Instituição possa avaliar e monitorar os riscos envolvidos no seu Plano de Contratações Anual.

Avaliações, impressões e conclusões:

Em cumprimento ao mencionado decreto, o DCL, Departamento de Compras e Licitações, elaborou o Plano de contratações anual - Univasf 2025 o qual encontra-se disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio do seguinte sítio eletrônico <<https://pncp.gov.br/app/pca/05440725000114/2024>>. Até a conclusão do presente.


Este relatório, apresenta o mapa de riscos com o detalhamento de eventos que podem impactar no andamento dos processos e na sua possível não realização das contratações pretendidas com levantamento das possíveis causas que levariam à possibilidade de efetivação do risco, das consequências (impacto caso o risco se consolidasse) e das medidas preventivas a serem adotadas para mitigação dos riscos analisados nos processos.

2. Contexto atual das Contratações até 30 de junho em números (PCA 2025) primeiro semestre de 2025.

Das 123 contratações criadas para execução em 2025, 63 delas foram planejadas com previsão conclusão até 30/06/2025. Após análise obtivemos o seguinte resultado:

Quantidade: 63

Categoria	Quantidade total	Valor total	Concluídas	Em andamento	Não iniciadas
Bens	29	17.031.394,47	6.743.605,66	1.441.676,46	8.646.112,35
Serviços	32	111.683.684,42	108.078.608,42	1.974.870,00	1.630.206,00
TIC	01	1.845.000,00	-	-	1.845.000,00
Obras	02	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
Total	63	132.060.078,89	114.822.214,08	3.416.546,46	13.821.318,35

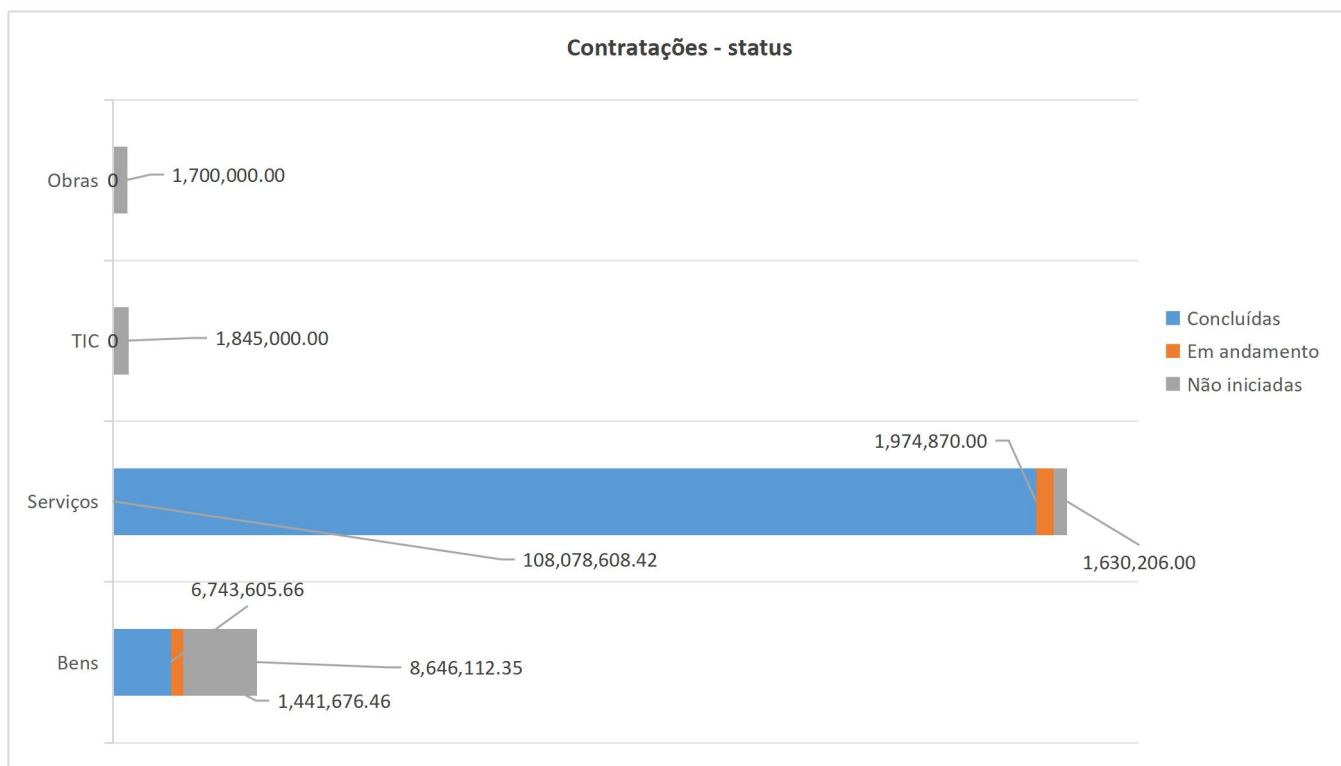

O gráfico a seguir ilustra a distribuição em valores da situação das contratações de serviços com conclusão para o primeiro semestre.



Vale ressaltar que essas contratações de serviços concluídas integram os contratos vigentes com despesas para 2025 (contratos prorrogados e por tempo indeterminados e as contratações efetivamente realizadas) conforme dados a seguir:

TIPO DE CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	EM PERCENTUAL (%)
CONTRATOS NOVOS	11	68.066.418,72	60,95
CONTRATOS POR TEMPO INDETERMINADOS (PREVISÃO DE GASTOS) PARA O EXERCÍCIO	02	10.380.616,91	9,3
CONTRATOS PRORROGADOS (PREVISÃO DE GASTOS) PARA O EXERCÍCIO	11	29.631.572,79	26,5

Conforme gráfico abaixo:



Na tabela abaixo está demonstrada a representatividade das contratações previstas para finalização em junho/2025 e a situação até dia 30 do citado mês.

BENS

	Número da contratação	Título da contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Área requisitante	Nº DFD	Prioridade	Valor Total	STATUS
1	002/2025	Materiais Gráficos (AQUISICAO)	26/06/2025	PROPLADI	64/2024	Alto	3.115.313,78	SEM INFORMAÇÕES
2	003/2025	Agua mineral 20 litros e vasilhames	22/04/2025	PROPLADI	35/2024	Alto	249.494,72	EM ANDAMENTO
3	004/2025	Divisorias (aquisição)	03/02/2025	MANUTENÇÃO	109/2024	Alto	400.000,00	SEM INFORMAÇÕES
4	124/2025	Aquisição de equipamentos para laboratório de Geologia.	30/06/2025	PROPLADI	05/2025	Médio	601.309,35	EM ANDAMENTO
5	134/2025	Aquisição de Materiais Diversos para implantações de ações da DDI.	30/06/2025	PROPLADI	129/2025	Médio	260.682,49	SEM INFORMAÇÕES
6	149/2025	Aquisição de Esmerilhadeira Angular 850W 127V com 3 Discos e Maleta.	20/06/2025	HVET	145/2025	Médio	732	EM ANDAMENTO
7	150/2025	Bomba de equipo universal Portátil; Item : 8 Bomba de seringa universal Portátil.	20/06/2025	HVET	146/2025	Médio	38.480,00	EM ANDAMENTO
	150/2025	Bomba de equipo universal Portátil; Item : 8 Bomba de seringa universal Portátil.	20/06/2025	HVET	146/2025	Médio	16.920,00	
8	152/2025	Peças para manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico.	30/06/2025	HVET	140/2025	Alto	3.500,00	EM ANDAMENTO
	152/2025	Peças para manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico.	30/06/2025	HVET	140/2025	Alto	1.400,00	
	152/2025	Peças para manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico.	30/06/2025	HVET	140/2025	Alto	2.720,00	
9	24/2025	Material de Expediente Escolar, camisetas, ecobag e Squeeze.	20/05/2025	PROPLADI	74/2024	Alto	293.616,08	SEM INFORMAÇÕES
10	28/2025	Gás 45Kg e Gás GLP 13kg e Vasilhame (Botijão 13kg).	25/06/2025	PROPLADI	62/2024	Alto	27.120,39	EM ANDAMENTO

11	22/2025	Mobiliários par biblioteca.	30/06/2025	SIBII	101/2024	Médio	300.000,00	EM ANDAMENTO
12	35/2025	Mobiliário e Afins	30/06/2025	NGPS	83/2024	Baixo	250.000,00	SEM INFORMAÇÕES
13	46/2025	Material de campo.	28/03/2025	CEMAFAUNA	171/2024	Baixo	105.000,00	SEM INFORMAÇÕES
14	47/2025	Equipamentos Diversos	30/06/2025	NGPS	81/2024	Baixo	93.100,00	SEM INFORMAÇÕES
15	50/2025	Vidrarias e reagentes laboratório	11/04/2025	CEMAFAUNA	172/2024	Baixo	50.000,00	SEM INFORMAÇÕES
16	52/2025	Vidrarias e reagentes.	11/04/2025	CEMAFAUNA	172/2024	Baixo	50.000,00	SEM INFORMAÇÕES
17	85/2025	Aquisição de equipamentos para salas de vídeo conferência e microfones para rádio FM.	24/01/2025	TV CAATINGA	186/2024	Médio	81.500,00	SEM INFORMAÇÕES
	85/2025	Aquisição de equipamentos para salas de vídeo conferência e microfones para rádio FM.	24/01/2025	TV CAATINGA	193/2024	Médio	252.000,00	
18	86/2025	Equipamentos para implantação da Rádio Fm Universitária	06/01/2025	TV CAATINGA	191/2024	Médio	1.273.000,00	SEM INFORMAÇÕES
19	87/2025	Baterias para câmeras filmadoras, microfones e nobreaks.	14/02/2025	TV CAATINGA	184/2024	Médio	40.000,00	SEM INFORMAÇÕES
	87/2025	Baterias para câmeras filmadoras, microfones e nobreaks.	14/02/2025	TV CAATINGA	185/2024	Médio	37.900,00	
20	88/2025	Hard Disk para o servidor e computadores (Ilhas de edição) da TV Caatinga e notebook.	06/03/2025	TV CAATINGA	178/2024	Médio	34.000,00	SEM INFORMAÇÕES
	88/2025	Hard Disk para o servidor e computadores (Ilhas de edição) da TV Caatinga e notebook.	06/03/2025	TV CAATINGA	183/2024	Médio	62.000,00	
21	89/2025	Equipamentos para implantação da TV Caatinga em Canal Aberto no Município de Petrolina-PE	06/01/2025	TV CAATINGA	192/2024	Médio	2.248.000,00	SEM INFORMAÇÕES

9.887.788,81

SERVIÇOS

	Número da contratação	Título da contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Área requisitante	Nº DFD	Prioridade	Valor Total	STATUS
1	113/2025	Serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras frias. (possível renovação contratual)	31/01/2025	MANUTENÇÃO	112/2024	Alto	120.000,00	SEM INFORMAÇÕES
2	136/2025	Instalação e treinamento de equipamento de esterilização- Autoclave ONIX 360L- HVET	27/06/2025	HVET	142/2025	Alto	9.000,00	EM ANDAMENTO
3	142/2025	SERVIÇOS GRÁFICOS para a confecção de diplomas e certificados personalizados PRPPGI.	30/05/2025	PRPPGI	127/2025	Médio	7.000,00	SEM INFORMAÇÕES
	142/2025	SERVIÇOS GRÁFICOS para a confecção de diplomas e certificados personalizados PRPPGI.	30/05/2025	PRPPGI	127/2025	Médio	900	
4	148/2025	Manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico LABTEST, 3 partes, SDH-3 Vet Standard	30/06/2025	HVET	140/2025	Alto	900	EM ANDAMENTO
5	25/2025	Serviços de Locação de Veículos.	07/03/2025	NEMA	66/2024	Baixo	1.964.970,00	EM ANDAMENTO
6	63/2025	Serviço de dedetização (NEMA).	18/04/2025	NEMA	167/2024	Baixo	59.906,00	SEM INFORMAÇÕES
7	90/2025	Contratação para Operacionalização dos Estúdios da Rádio e TV Caatinga da UNIVASF.	02/01/2025	TV CAATINGA	182/2024	Médio	1.440.000,00	SEM INFORMAÇÕES
8	151/2025	Manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico do HVET.	30/06/2025	HVET	140/2025	Alto	2.400,00	SEM INFORMAÇÕES

3.605.076,00


OBRAS

1	103/2025	Setor de Oncologia do Hospital Veterinário Universitário(obra)	26/06/2025	HVET	275/2024	Baixo	700.000,00	SEM INFORMAÇÕES
2	40/2025	Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil.	11/03/2025	NGPS	80/2024	Baixo	1.000.000,00	SEM INFORMAÇÕES
							1700.000,00	

TIC

1	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	30/06/2025	STI	147/2024	Alto	56.500,00	SEM INFORMAÇÕES
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	30/06/2025	STI	147/2024	Alto	58.500,00	
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	30/06/2025	STI	147/2024	Alto	350.000,00	
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	30/06/2025	STI	147/2024	Alto	20.000,00	
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	30/06/2025	STI	147/2024	Alto	1.360.000,00	
							1845.000,00	

Das contratações sem informações/não iniciadas, sete foram classificadas como de alta prioridade. Ressalta-se que a análise do impacto decorrente da não conclusão dessas contratações é essencial avaliar o impacto da não conclusão dessas demandas.

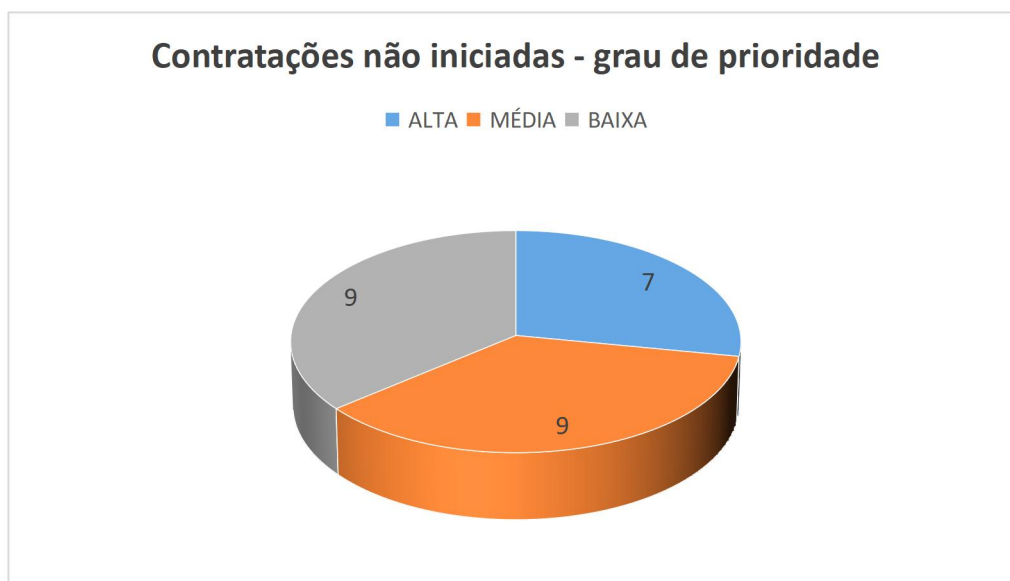GRAFICO

O maior risco de insucesso nas contratações são aquelas com status “sem informação”, ou seja que ainda não foram iniciadas.

A ausência de dados sobre o planejamento, é um fator impeditivo na identificação de possíveis problemas, dificultando a previsão de forma mais precisa na mitigação das falhas, o que aumenta a incerteza e a chance de que a contratação seja realizada.

As contratações iniciadas tem risco moderado, uma vez que encontram-se em curso.

O risco das contratações foi classificado como moderado, uma vez que, embora estejam em andamento, enfrentam desafios que podem comprometer o cronograma e a execução, conforme as condições descritas a seguir.

Ainda na fase de planejamento, as falhas na definição do objeto da contratação, na elaboração dos artefatos (ETP, termos de referência e na estimativa incorreta dos valores), demandam correções ao longo do processo, o que gera atrasos.

Já na fase de seleção de fornecedor realizada pela equipe de pregoeiros, na Coordenação de Licitações, o curto tempo, causado pelo atraso na etapa de planejamento, sobrecarrega o setor, ficando prejudicadas as análises cuidados dos processos. Com isso aumenta os riscos de falhas, elevando a probabilidade de impugnações e recursos administrativos que retardam ainda mais a conclusão dos certame.



MAPA DE RISCOS - DEMANDAS PLANEJADAS E NÃO EFETIVADAS OU NÃO ENVIADAS AO SETOR DE CONTRATAÇÕES ATÉ JUNHO/2025

As demandas planejadas para conclusão no primeiro semestre de 2025, cujos processos de contratação, ainda não foram iniciados, serão solicitadas, às áreas requisitantes responsáveis, à avaliação e a justificativa da não execução em 2025.

CENÁRIO ATUAL DAS DEMANDAS DE CONTRATAÇÕES PLANEJADAS E NÃO EFETIVADAS

As demandas de contratações planejadas e não iniciadas ou não concluídas, até o momento da elaboração deste relatório de risco, foram identificadas verificando-se as informações relativas às datas estimadas para a conclusão do processo de contratação, contidas no calendário de contratações, de que trata o inciso III do art. 11 do Decreto nº 10.947, de 2022.

Após a finalização deste relatório, todos os demandantes serão informados por e-mail, pgc-l@univasf.edu.br e grupo de whatsapp.

Uma avaliação por parte dos setores requisitantes será importante no tocante a:

- Avaliar e justificar a necessidade de reprogramação da data de conclusão (ainda para 2025, ou a ser remanejada para o PCA 2026)
- Analisar a conveniência e a oportunidade de fazer uso da lista exemplificativa de riscos, para a elaboração do respectivo Mapa de Risco, afetos à fase de planejamento.

Contratações não iniciadas e em andamento, possíveis riscos - Anexo I

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise do relatório julho/2025, verificou-se que algumas datas informadas como prazos desejados para conclusão não foram indicadas de forma adequada, uma vez que os processos não chegaram em tempo hábil, próximo ao preestabelecido no documento de formalização de demanda (DFD), para a conclusão do processo de contratação.

Foi verificado também que as causas comuns a não conclusão ou atraso ocorreram por:

- ✓ Contingenciamento orçamentário, que limita a execução de determinadas demandas;
- ✓ Dificuldades na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- ✓ Dificuldades na utilização dos artefatos, especialmente em sua forma digital, cuja adoção se tornou obrigatória a partir de 2024;
- ✓ Atrasos no andamento dos processos decorrentes do desconhecimento da gama de documentos que devem compor o processo de contratação;
- ✓ Cultura limitada de não utilização, por alguns setores, de outros meio de contratação, como a busca de atas de pregões por SRP para participação na origem ou adesão tardia;
- ✓ Deficiências no gerenciamento do tempo durante as fases do planejamento.

Diante de todo exposto, das tabelas e gráficos, demonstrativo das contratações concluídas, iniciadas e não iniciadas, das possíveis falhas ocorridas que culminaram no não atingimento na finalização de algumas contratações, fica a sugestão a todos nós, envolvidos no processo de contratação, a importância de enxergarmos o PCA como uma ferramenta que nos permite uma visão antecipada das demandas e necessidades dos nossos setores e da Univasf como um todo.

Dessa forma, o DCL sugere a adoção de medidas que visem a mitigação dos riscos identificados pelas unidades demandantes para adoção de medidas preventivas e de contingência informadas de forma que possam em seus processos de contratação:

- Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoas específicas para tratar dos processos de aquisição;
- Classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas e assim garantir o sucesso na contratação no prazo necessário à utilização dos bens e/ou serviços.

ANEXO I - Contratações não iniciadas e andamento, possíveis riscos

BENS

	Número da contratação	Título da contratação	Área requisitante	Nº DFD	Prioridade	Valor Total	STATUS/FASE	EVENTO DO RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCOS	CONSEQUENCIAS DOS RISCOS	AÇÃO DE CONTINGENCIA	ANÁLISE DO RISCO
1	002/2025	Materiais Gráficos (AQUISICAO)	PROPLADI	64/2024	Alto	3.115.313,78	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INICIADO	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.	insuficiência de pessoal chave para compor a equipe de planejamento (requisitante, administrativo e técnico). insuficiência de pessoal na área de licitações (seleção de fornecedor). Dificuldade em formar estimativa de preços (fornecedores pesquisados não atendem aos pedidos de cotação)Falhas na elaboração dos artefatos.	Atrasos na conclusão da contratação ou até mesmo fracasso no processo licitatório.	identificar na gestão de competências, pessoal com perfil e disponibilidade para lotar na área de planejamento e seleção de fornecedores nas contratações. investimento em capacitações contínuas para os servidores que trabalham nas áreas de contratações em todas as fases.Esgotar diferentes fontes de buscas para obter um maior número de cota de preços possível.	MÉDIO
2	003/2025	Agua mineral 20 litros e vasilhames - PROCESSO: 23402.016722/2025-15	PROPLADI	35/2024	Alto	249.494,72	FASE DE LANÇAMENTO DE EDITAL	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.	Estudos preliminares deficientes/Termo de referência incompleto, ausência de exigências necessárias.	Atrasos na conclusão da contratação ou até mesmo fracasso no processo licitatório.	identificar na gestão de competências, pessoal com perfil e disponibilidade para lotar na área de planejamento e seleção de fornecedores nas contratações. investimento em capacitações contínuas para os servidores que trabalham nas áreas de contratações em todas as fases. Esgotar diferentes fontes de buscas para obter um maior número de cota de preços possível.	ALTO
3	004/2025	Divisorias (aquisição)	MANUTENÇÃO	109/2024	Alto	400.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INICIADO	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.	insuficiência de pessoal chave para compor a equipe de planejamento (requisitante, administrativo e técnico). insuficiência de pessoal na área de licitações (seleção de fornecedor). Dificuldade em formar estimativa de preços (fornecedores pesquisados não atendem aos pedidos de cotação)Falhas na elaboração dos artefatos.	Atrasos na conclusão da contratação ou até mesmo fracasso no processo licitatório.	identificar na gestão de competências, pessoal com perfil e disponibilidade para lotar na área de planejamento e seleção de fornecedores nas contratações. investimento em capacitações contínuas para os servidores que trabalham nas áreas de contratações em todas as fases. Esgotar diferentes fontes de buscas para obter um maior número de cota de preços possível.	MÉDIO
4	124/2025	Aquisição de equipamentos para laboratório de Geologia. PROC. 23402.000935/2025-25	PROPLADI	005/2025	Médio	601.309,35	EM ANDAMENTO/FASE SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Estudos preliminares deficientes	Falha na identificação da melhor solução.	Lentidão na contratação ou até mesmo insucesso por conta de impugnações e recursos.	Certificação junto aos requisitantes de consulta ao mercado fornecedor dos itens	ALTO

5	134/2025	Aquisição de Materiais Diversos para implantações de ações da DDI. Proc. 23402.039893/2024-31	PROPLADI	129/2025	Médio	260.682,49	EM ANDAMENTO/AJUSTES ARTEFATOS	Termo de Referência incompleto com características insuficientes do bem e ou com ausências de exigências necessárias na contratação.	pouco conhecimento da legislação vigente, bem como dos artefatos necessários à contratação.	Lentidão na contratação, ou até mesmo insucesso por conta de impugnações e recursos.	investimento em capacitações contínuas para os servidores que trabalham nas áreas de contratações em todas as fases/ Esgotar diferentes fontes de buscas para obter um maior número de cota de preços possível.	MÉDIO
6	149/2025	Aquisição de Esmerilhadeira Angular 850W 127V com 3 Discos e Maleta.	HVET	145/2025	Médio	732	EM ANDAMENTO/AGUARDANDO AJUSTES NO SISTEMA DE ATAS	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	MÉDIO
7	150/2025	Bomba de equipo universal Portátil; Item : 8 Bomba de seringa universal Portátil.	HVET	146/2025	Médio	38.480,00	EM ANDAMENTO/AGUARDANDO AJUSTES NO SISTEMA DE ATAS	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	MÉDIO
8	150/2025	Bomba de equipo universal Portátil; Item : 8 Bomba de seringa universal Portátil.	HVET	146/2025	Médio	16.920,00	EM ANDAMENTO/AGUARDANDO AJUSTES NO SISTEMA DE ATAS	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	MÉDIO
	152/2025	Peças para manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico.	HVET	140/2025	Alto	3.500,00	EM ANDAMENTO/AGUARDANDO AJUSTES NO SISTEMA DE ATAS	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	ALTO
9	152/2025	Peças para manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico.	HVET	140/2025	Alto	1.400,00	EM ANDAMENTO/AGUARDANDO AJUSTES NO SISTEMA DE ATAS	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	
	152/2025	Peças para manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico.	HVET	140/2025	Alto	2.720,00	EM ANDAMENTO/AGUARDANDO AJUSTES NO SISTEMA DE ATAS	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	
	22/2025	Acervo - livros Proc. 23402.002449/2025-41	SIBI	101/2024	Alto	300.000,00	EM ANDAMENTO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	ALTO
10	24/2025	Material de Expediente Escolar, camisetas, ecobag e Squeeze.	PROPLADI	74/2024	Alto	293.616,08	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INICIADO	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores; Ausência de verificação de Atas de Registro de Preços vigentes ou de outras fontes previstas na norma;	Atrasos na conclusão da contratação ou até mesmo fracasso no processo licitatório.	Realização de pesquisa de preços; Consulta a Atas de Registro de Preços vigentes ou de outras fontes previstas na norma; Capacitação dos servidores quanto as normas, utilização dos artefatos e aos procedimentos necessários à pesquisa de preços.	ALTO

11	28/2025	Gás 45Kg e Gás GLP 13kg e Vasilhame (Botijão 13kg).	PROPLADI	62/2024	Alto	27.120,39	EM ANDAMENTO	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação o (retrabalho após parecer jurídico, cumprimento das recomendações)	Ausência de adequada parametrização na elaboração dos documentos, remetendo a necessidade das mesmas adequações.	Atrasos na conclusão da contratação.	padronização das etapas internas nos documentos do planejamento com o intuito de evitar as correções já informadas em outras análises de situações semelhantes.	ALTO
12	33/2025	Mobiliários par biblioteca.	SIBI	107/2024	Médio	200.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	MÉDIO
13	35/2025	Mobiliário e Afins	NGPS	83/2024	Baixo	250.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
14	46/2025	Material de campo.	CEMAFAUNA	171/2024	Baixo	105.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
15	47/2025	Equipamentos Diversos	NGPS	81/2024	Baixo	93.100,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
16	50/2025	Vidriarias e reagentes laboratório	CEMAFAUNA	172/2024	Baixo	50.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
17	52/2025	Vidriarias e reagentes.	CEMAFAUNA	172/2024	Baixo	50.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
18	85/2025	Aquisição de equipamentos para salas de vídeo conferência e microfones para rádio FM.	TV CAATINGA	186/2024	Médio	81.500,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
19	85/2025	Aquisição de equipamentos para salas de vídeo conferência e microfones para rádio FM.	TV CAATINGA	193/2024	Médio	252.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
	86/2025	Equipamentos para implantação da Rádio Fm Universitária	TV CAATINGA	191/2024	Médio	1.273.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
20	87/2025	Baterias para câmeras filmadoras, microfones e nobreaks.	TV CAATINGA	184/2024	Médio	40.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO

21	87/2025	Baterias para câmeras filmadoras, microfones e nobreaks.	TV CAATINGA	185/2024	Médio	37.900,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
	88/2025	Hard Disk para o servidor e computadores (Ilhas de edição) da TV Caatinga e notebook.	TV CAATINGA	178/2024	Médio	34.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
22	88/2025	Hard Disk para o servidor e computadores (Ilhas de edição) da TV Caatinga e notebook.	TV CAATINGA	183/2024	Médio	62.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
	89/2025	Equipamentos para implantação da TV Caatinga em Canal Aberto no Município de Petrolina-PE	TV CAATINGA	192/2024	Médio	2.248.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO

10.087.788,81

SERVIÇOS

	Número da contratação	Título da contratação	Área requisitante	Nº DFD	Prioridade	Valor Total	STATUS	EVENTO DO RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCOS	CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS	AÇÃO DE CONTINGENCIA	ANÁLISE DO RISCO
1	113/2025	Serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras frias. (possível renovação contratual)	MANUTENÇÃO	112/2024	Alto	120.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores; Ausência de verificação de Atas de Registro de Preços vigentes ou de outras fontes previstas na norma;	Atrasos na conclusão da contratação ou até mesmo fracasso no processo licitatório.	Realização de pesquisa de preços; Consulta em IRP para participação na origem, consulta a Atas de Registro de Preços vigentes ou de outras fontes previstas na norma; Capacitação dos servidores quanto as normas, utilização dos	ALTO
3	136/2025	Instalação e treinamento de equipamento de esterilização- Autoclave ONIX 360L- HVET	HVET	142/2025	Alto	9.000,00	EM ANDAMENTO	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das normas e etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	ALTO
4	142/2025	SERVIÇOS GRÁFICOS para a confecção de diplomas e certificados personalizados PRPPGI.	PRPPGI	127/2025	Médio	7.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação (retrabalho após parecer jurídico, cumprimento das recomendações)	Ausência de adequada parametrização na elaboração dos documentos, remetendo a necessidade das mesmas adequações.	Atrasos na conclusão da contratação.	padronização das etapas internas dos documentos do planejamento com o intuito de evitar as correções já informadas em outras análises de situações semelhantes.	BAIXO
	142/2025	SERVIÇOS GRÁFICOS para a confecção de diplomas e certificados personalizados PRPPGI.	PRPPGI	127/2025	Médio	900	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação (retrabalho após parecer jurídico, cumprimento das recomendações)	Ausência de adequada parametrização na elaboração dos documentos, remetendo a necessidade das mesmas adequações.	Atrasos na conclusão da contratação.	padronização das etapas internas dos documentos do planejamento com o intuito de evitar as correções já informadas em outras análises de situações semelhantes.	BAIXO
5	148/2025	Manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico LABTEST, 3 partes, SDH-3 Vet Standard	HVET	140/2025	Alto	900	EM ANDAMENTO	Ausência de documentos e/ou etapas para conclusão da contratação por adesão	Desconhecimento das normas e etapas de sistemas na adesão de atas	Atraso na contratação	Padronização dos documentos utilizados nas etapas de cada contratação, bem como nas adesões, capacitação referente a legislação e sistemas	ALTO

6	25/2025	Serviços de Locação de Veículos.	NEMA	66/2024	Baixo	1.964.970,00	EM ANDAMENTO	Termo de Referência incompleto com características insuficientes do bem e ou com ausências de exigências necessárias na contratação.	pouco conhecimento da legislação vigente, bem como dos artefatos necessários à contratação.	Lentidão na contratação, ou até mesmo insucesso por conta de impugnações e recursos.	investimento em capacidades contínuas para os servidores que trabalham nas áreas de contratações em todas as fases/ Esgotar diferentes fontes de buscas para obter um maior número de cotações de preços possível.	MÉDIO
9	63/2025	Serviço de dedetização (NEMA).	NEMA	167/2024	Baixo	59.906,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Termo de Referência incompleto com características insuficientes do bem e ou com ausências de exigências necessárias na contratação.	pouco conhecimento da legislação vigente, bem como dos artefatos necessários à contratação.	Lentidão na contratação, ou até mesmo insucesso por conta de impugnações e recursos.	investimento em capacidades contínuas para os servidores que trabalham nas áreas de contratações em todas as fases/ Esgotar diferentes fontes de buscas para obter um maior número de cotações de preços possível.	ALTO
10	90/2025	Contratação para Operacionalização dos Estúdios de Rádio e TV Caatinga da UNIVASF.	TV CAATINGA	182/2024	Médio	1.440.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	MÉDIO
11	151/2025	Manutenção corretiva e preventiva Analisador Hematológico do HVET.	HVET	140/2025	Alto	2.400,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	ALTO

3.605.076,00

OBRAS

	Número da contratação	Título da contratação	Área requisitante	Nº DFD	Prioridade	Valor Total	STATUS	EVENTO DO RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCOS	CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS	AÇÃO DE CONTIGENCIA	ANÁLISE DO RISCO
1	103/2025	Setor de Oncologia do Hospital Veterinário Universitário(obra)	HVET	275/2024	Baixo	700.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
2	40/2025	Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil.	NGPS	80/2024	Baixo	1.000.000,00	SEM INFORMAÇÕES/NÃO INCIADO	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO

1700000,00

TIC

	Número da contratação	Título da contratação	Área requisitante	Nº DFD	Prioridade	Valor Total	STATUS	EVENTO DO RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCOS	CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS	AÇÃO DE CONTINGENCIA	ANÁLISE DO RISCO
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	STI	147/2024	Alto	56.500,00	SEM INFORMAÇÕES	Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	STI	147/2024	Alto	58.500,00		Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
1	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	STI	147/2024	Alto	350.000,00		Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	STI	147/2024	Alto	20.000,00		Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
	96/2025	Equipamentos, peças e acessórios de Tecnologia da Informação e afins.	STI	147/2024	Alto	1.360.000,00		Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições orçamentárias;	Indisponibilidade orçamentária para realização da aquisição.	Impossibilidade de contratação; Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.	Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.	BAIXO
						1845000,00						
